



I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO EJECUCION Y PROYECTOS

**MODIFICACION PLAZO EN EL
PROYECTO DENOMINADO
"CONSTRUCCION ACCESO
ESTADIO MUNICIPAL
VALLENAR".**

VALLENAR 08 FEB 2010

DECRETO EXENTO : N° 0990

VISTOS:

1. La necesidad de regularizar la ampliación plazo para el buen término de la Obra, por las reiteradas modificaciones en el cierre trasero del proyecto, la paralización de las actividades laborales y el lento proceso en la adquisición de los materiales a través del portal chilecompra en el proyecto **"CONSTRUCCION ACCESO ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
2. Visto el Decreto Exento N° 3941 del 31 de Julio del 2009., Donde se aprueba el Proyecto. **"CONSTRUCCION ACCESO ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
3. Visto el Decreto Exento N° 632 del 22 de Enero del 2010., Donde se aprueba la modificación del plazo de ejecución del Proyecto. **"CONSTRUCCION ACCESO ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
4. La modificación de los ítems de las partidas Mano de Obra correspondientes al presupuesto del Proyecto **"CONSTRUCCION ACCESO ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR"**.
5. El Certificado N° 50 del 29 de enero de 2010, emanado de la Dirección de Administración y Finanzas, donde asigna la suma de \$ 1.191.997.- como disponibilidad presupuestaria al proyecto.
6. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.


DECRETO:

1. Apruébese la ampliación de plazo en los ítems de las partidas Mano de Obra y Materiales del presupuesto correspondiente al Proyecto **“CONSTRUCCION ACCESO ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR”**.
2. La ampliación de plazo de los ítems de las partidas Mano de Obra y Materiales del presupuesto correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCION ACCESO ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR”** se hará efectiva a contar del 01 al 28 Febrero del 2010.
3. Las Modificaciones de los ítems de las partidas Mano de Obra y Materiales modifican el monto del presupuesto del proyecto **“CONSTRUCCION ACCESO ESTADIO MUNICIPAL, VALLENAR”** que es de \$ 46.640.000.- asígnese como monto adicional al proyecto la cantidad de \$ 1.191.997 Impuesto incluido del presupuesto municipal vigente, ítem 215-31-02 Proyectos, asignación 004-010 “Construcción, mantención y reparación infraestructura”.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


GABRIEL OMAR GALLEGUILLOS CORNEJO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

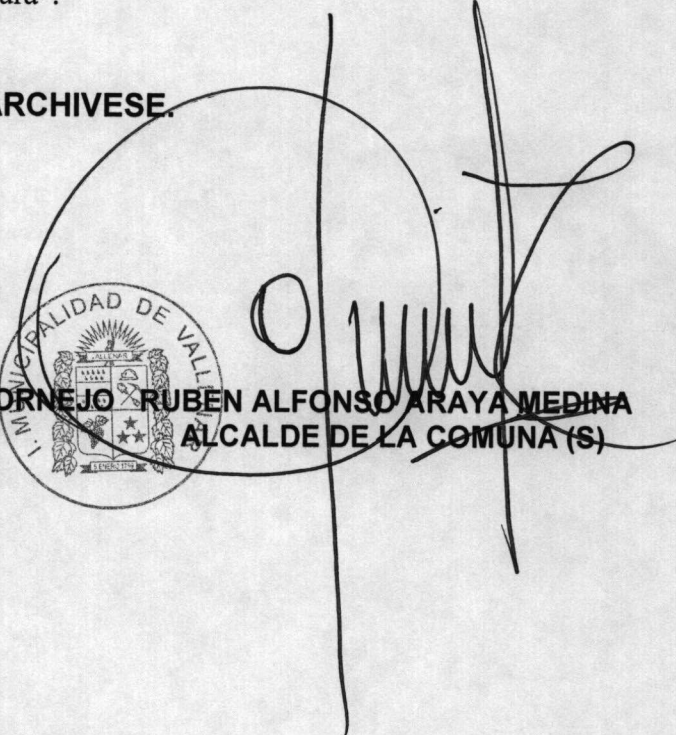


RUBEN ALFONSO ARAYA MEDINA
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

DISTRIBUCIÓN:

- SUBDERE MIN. INTERIOR
 - GOB. REGIONAL
 - UNIDAD DE CONTROL REGIONAL.
 - D.A.F.
 - D.O.M.(2)
 - SECPLA.
 - DIRECCION DE CONTROL.
 - SECRETARIA MUNICIPAL.
 - ARCH. OFICINA DE PARTES.
- RAAM/GOGC/MMY/GGC/LAA/1aa
